


Nieuwsbrief juni 2014

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden die wij momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren aan de onderzijde van de Boogbrug in Beek.

Werkzaamheden volop in uitvoering

We voeren het onderhoud uit in 3 fases. In onderstaande figuur staan die fases aangegeven.

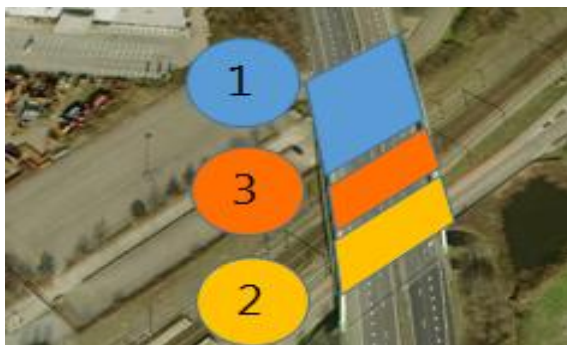

Uitvoering in 3 fases:

1. Boven Chemelot-terrein
2. Boven Middelweg
3. Boven spoor

Fase 1: Werkzaamheden boven Chemelot-terrein

Fase 1 is gestart met het opbouwen van de steigers. Dit gebeurde op 7 april jongstleden. Nu zijn we ruim 3 maanden verder en hebben we zo'n 80% van fase 1 in de nieuwe verf zitten. We verwachten fase 1 op 26 juni aanstaande te kunnen afronden.

Fase 2: Werkzaamheden boven Middelweg

Begin mei hebben de steigers geplaatst ter hoogte van de Middelweg. Dit is zonder problemen verlopen. Op 12 juni zijn we gestart met het stralen van de onderzijde van dit deel van de brug. De schilderklus, inclusief het uitvoeren van kleine reparaties, willen we voor 1 augustus gereed hebben.

Daarna komt fase 3 aan de beurt, het onderhoud van de onderzijde van de brug boven het spoor. Wij moeten onze werkzaamheden hierbij zodanig inplannen dat dit past met het werk dat ProRail tussen augustus en eind november op meerdere plekken uitvoert aan de spoorlijn Maastricht-Sittard. In een van de volgende nieuwsbrieven gaan we hier verder op in.



Foto: Onze mensen zijn bezig met het schilderwerk aan de onderzijde van de brug (fase 1)

Meer informatie gewenst?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u meer te weten komen over onze werkzaamheden aan de brug, kijk dan op onze website www.vanderende.nl/csb. Op deze website staan ook de contactgegevens vermeld als u een vraag heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, als u maandelijks van ons een voortgangsbericht wilt ontvangen of als u bijvoorbeeld een klacht wilt melden.

Met vriendelijke groet,

Van der Ende Straalwerken B.V.
